ACTIVIDADES Y CRONOGRAMA: PETWEB

L. PROFESOR: FERNANDO CALDERÓN CABRERA

NRC: 2012INTEGRANTES:

- Solórzano, Cristian Antoni
- Tafur, Maria Alexandra
- Torres, Javier Humberto
- Unzueta Luza, Maria Fernanda
- Escudero, Natalia Vasquez
- Villar, Maricielo Angela

- Villegas Bernaldo, Gonzalo
- Wharton Muñoz, Daniela
- Edu Henry Yaro
- Yestin Yong VIgo
- Zuazo, Alberto Avelino







PLAN ACTIVIDADES









DEFINICIÓN DE ACTIVIDAD DEL PROYECTO





1. Gestión del proyecto	2. Desarrollo de la web		
1.1. Inicio	2.1. Análisis y Definición		
1.1.1. Acta de Constitución 1.1.2. Registro de Interesados	2.1.1. Definición del público objetivo 2.1.2. Selección de contenido		
1.2. Planificación	2.2. Diseño		
1.2.1. Plan de Gestión de alcance	2.2.1. Maquetación de la página web y el contenid		
1.2.2. Requisitos 1.2.3. Enunciado del Alcance	2.3. Programación		
	2.3.1. Desarrollo del Backend y Frontend		
1.3. Control	3. Ejecución		
1.3.1. Reporte de Desempeño	3.1. Pruebas		
1.4. Cierre	3.1.1. Testeo de usabilidad web		
1.4.1. Acta de Aceptación	3.2. Lanzamiento		
	4. Mantenimiento		



ESTIMACIÓN DE LOS RECURSOS REQUERIDOS









1. Gestión del proyecto	Duración	Recursos	Predecesora		
1.1. Inicio					
1.1.1. Acta de Constitución	120d	J.Proyecto			
1.1.2. Registro de Interesados	6d	J.Proyecto	1.1.1		
1.2. Planificación					
1.2.1. Plan de gestión de Alcance	7d	M.Villar	1.1		
1.2.2. Requisitos	7d	J.Proyecto	1.2.1		
1.2.3. Enunciado de Alcance	5d	J.Proyecto	1.2.2		
1.3. Control					
1.3.1. Reporte de desempeño	3d	J.Proyecto	1.2		
1.4. Cierre					
1.4.1. Aceptación del Acta de Constitución	20d	A.Zuazo	1.3		






	Duración	Recursos	Predecesora		
2. Desarrollo de la web					
2.1. Análisis y Definición					
2.1.1. Definición del público objetivo	30d	J.Proyecto	1.4		
2.1.2. Selección de contenido	10d	J.Proyecto	2.1.1		
2.2. Diseño					
2.2.1. Maquetación de la página web y el contenido	10d	J.Proyecto	2.1		
2.3. Programación					
2.3.1. Desarrollo del backend y frontend de la página	10d	J.Proyecto	2.2		
3. Ejecución					
3.1. Pruebas					
3.1.1 Testeo de la usabilidad de la web	20d	G.Villegas	2.3		
3.2. Lanzamiento					
4. Mantenimiento					





DIAGRAMA DE RED Y RUTA CRÍTICA






Ruta Crítica	Tiempo
Inicio - A - B - F - G - H - I - J - K- L - Fin	124 días
Inicio - C - D - E - F - G - H - I - J - K- L - Fin	122 días




10 d



20 d

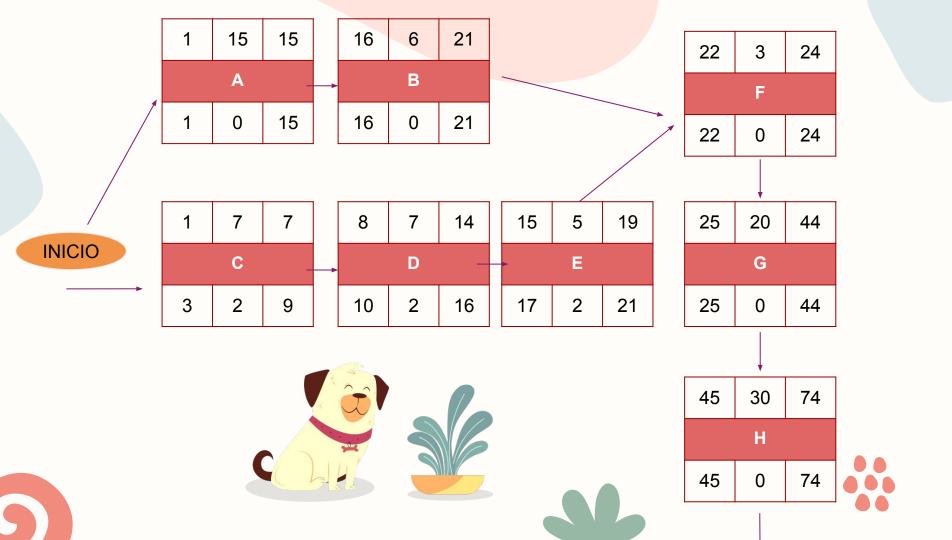



85	10	94
	J	
85	0	94

95	10	104		
	K			
95	0	104		

105	20	124			
L					
105	0	124			









CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO





Actividad	Actividad	Duración	Avance	Fecha de inicio plan	Fecha de fin plan	Recurso	Predecesora
А	Acta de Constitución	15d	100%	05/04/2022	20/04/2022	J. Proyecto	INCIO
В	Registro de Interesados	6d	100%	20/04/2022	26/04/2022	J. Proyecto	А
С	Plan de gestión de Alcance	7d	100%	26/04/2022	03/05/2022	M.Villar	А
D	Requisitos	7d	100%	03/05/2022	10/05/2022	J. Proyecto	А, В
E	Enunciado de Alcance	5d	100%	10/05/2022	15/05/2022	J. Proyecto	D
F	Reporte de desempeño	3d	100%	15/05/2022	18/05/2022	J. Proyecto	C, D, E
G	Aceptación del Acta de Constitución	20d	100%	18/05/2022	07/06/2022	A. Zuazo	F
Н	Definición del público objetivo	30d	0%	07/06/2022	07/07/2022	J. Proyecto	G
I	Selección de contenido	10d	0%	07/07/2022	17/07/2022	J. Proyecto	G
J	Maquetación de la página web y el contenido	10d	0%	17/07/2022	27/07/2022	J. Proyecto	Н, І
К	Desarrollo del backend y frontend de la página	10d	0%	27/07/2022	06/08/2022	J. Proyecto	J
L	Testeo de la usabilidad de la web	20d	0%	06/08/2022	26/08/2022	G. Villegas	К



NRC: 2012





